


Bericht aus der Verwaltung

BBW 21.04.2021



I Straße zum Königsgraben / Jägerstraße Dabendorf

- VTF ist davon ausgegangen, dass die Einmündung Jägerstraße / Glienicker Straße im Rahmen der Baumaßnahme Königsgraben ausgebaut wird
- Bereich war **nie** Bestandteil der Planung (Planung BV 110/19)

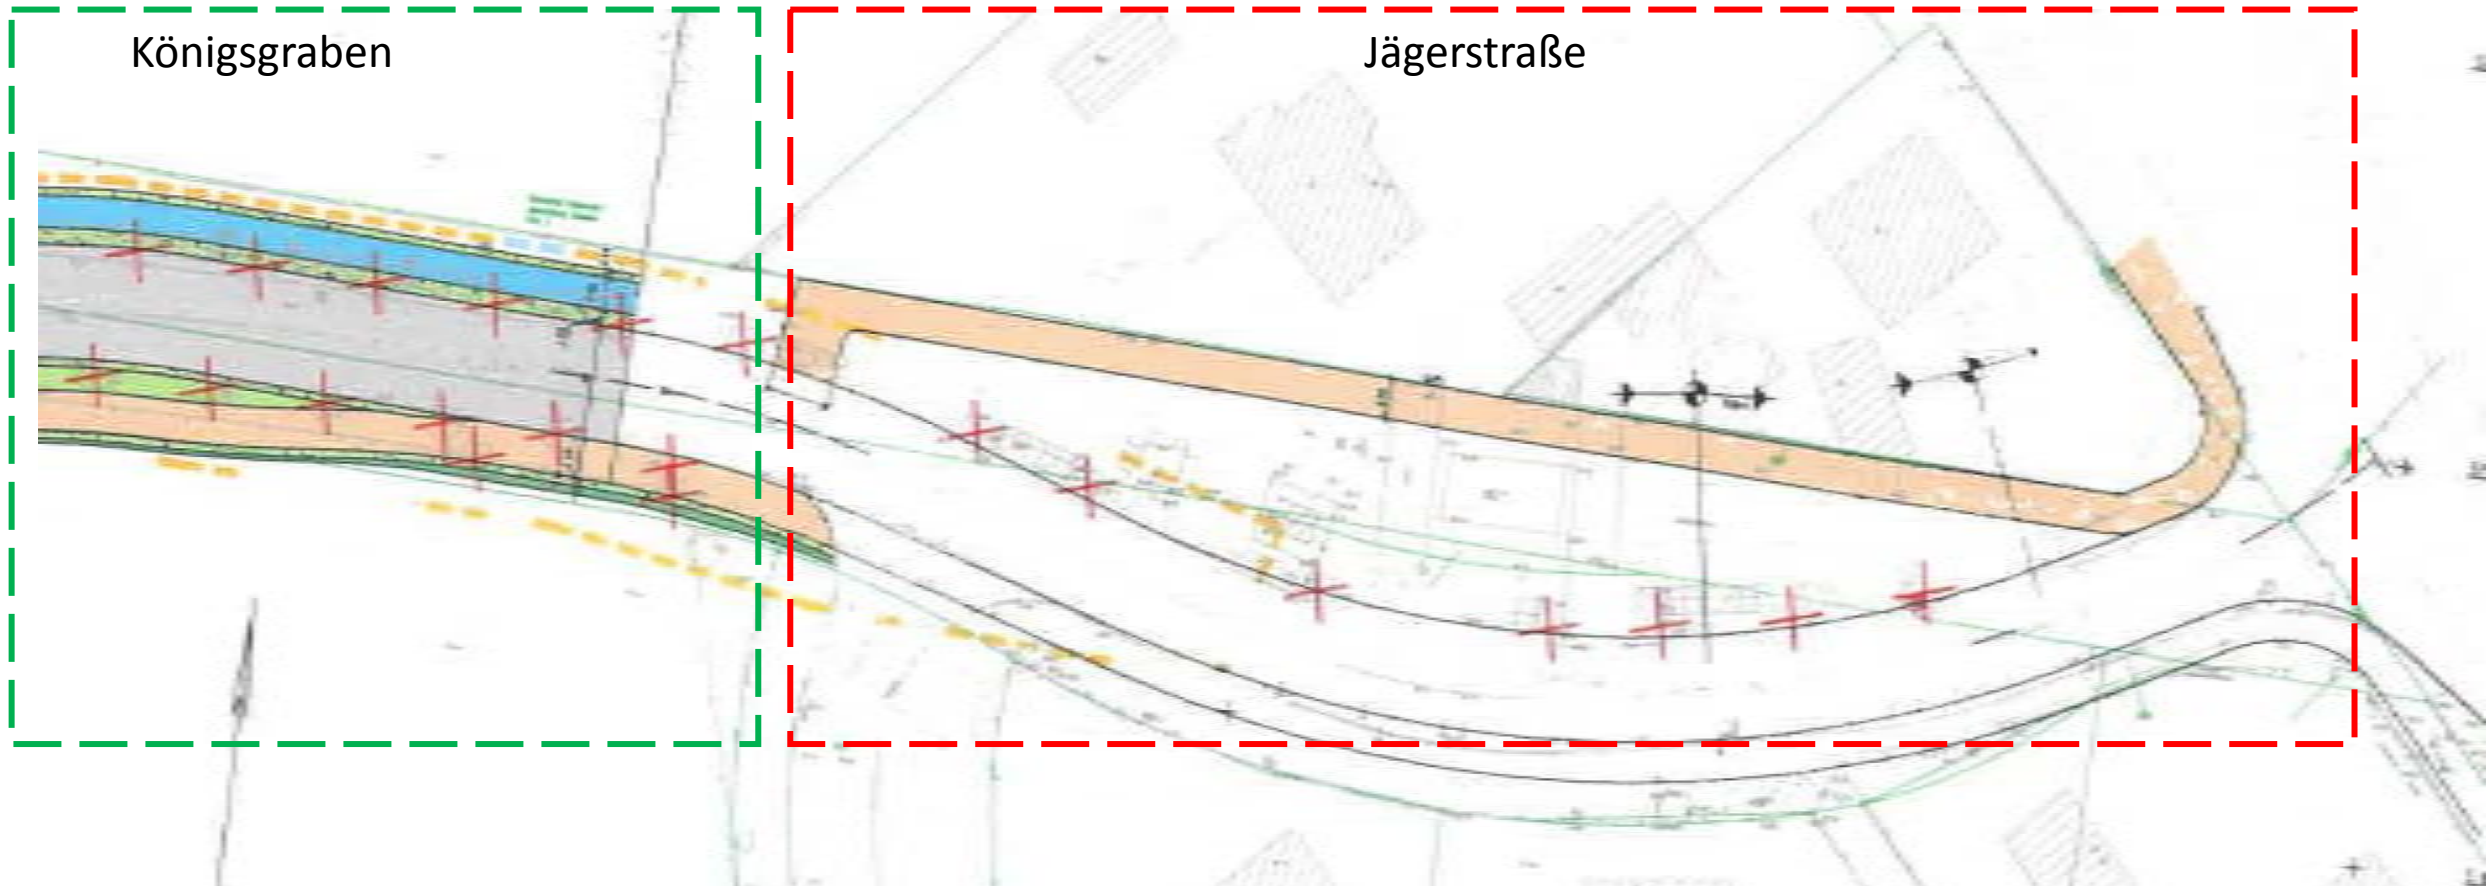

I Straße zum Königsgraben / Jägerstraße Dabendorf

Gelenkbus
Einfahrt
Jägerstraße
(aus Glienick
kommend)
VOT am
20.04.2021



I Straße zum Königsgraben / Jägerstraße Dabendorf

am Gehweg
Jägerstraße



I Straße zum Königsgraben / Jägerstraße Dabendorf

Begegnung
Bus / Bus
Jägerstraße



I Straße zum Königsgraben / Jägerstraße Dabendorf

- Bereich „Jägerstraße“ war **nie** Bestandteil der Planung „Zum Königsgraben“ (Planungsbeginn in 2014)
- Bestätigung der Planung durch die Stadtverordneten mit BV 110/19 (04.12.2019)
- 11.02.2021 Mitteilung durch den VTF, dass nicht in die Jägerstraße gefahren wird
- 20.04.2021 Vor-Ort-Termin, Feststellung, dass Jägerstraße nicht durch Gelenkbusse befahren werden kann
- **zusätzlich** Planung für die Einmündung bis Bauanfang Zum Königsgraben erforderlich (Kosten bis dato nicht berücksichtigt)
- **zusätzliche** Baukosten
- Untere Naturschutzbehörde hat eine Ausnahmegenehmigung für Baumfällungen in Aussicht gestellt

II Tiefbau

II.1 Strandbad Kallinchen Eingangsbereich

es fehlen noch ein Geländer und eine Schautafel

- Abnahme vor dem 1.5.2021 geplant

II.2 Spundwand Oertelufer:

- Baugrundsondierung ist erfolgt, Kostenschätzung wird erarbeitet

II.3 Regenwasser allgemein:

- Feuerwehr Wünsdorf – wasserrechtliche Erlaubnis ist bei Landkreis beantragt
- Kanäle in Zossen, Breite in Vorbereitung Bahnhofsquartier erfasst
- Kanäle in Horstfelde werden erfasst und gereinigt (in Arbeit)

II Tiefbau

II.4 Winterdienst 2020/2021

- Ausschreibung in Vorbereitung

II.5 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Bahnhof Wünsdorf

- derzeit Einholung von Planungsangeboten und Kostenschätzungen (bis Ende Mai 2021)
- Umsetzung der Planung erfolgt ab Juni 2021

III Hochbau

III.1 Feuerwehr Wünsdorf

- Fertigstellung Rohbau bis 30.04.2021
- Malerarbeiten für den 2. BA sind ausgeschrieben
- Bodenbelagsarbeiten für den 2.BA sind ausgeschrieben

III.2 Grundschule Zossen 2. Rettungsweg

Brandschutzkonzept ist zur Prüfung an das Ingenieurbüro gegeben

Angebotseinholung für die Planung Umsetzung Brandschutzkonzept (1. BA) läuft

**Danke für Ihre Aufmerksamkeit
Ihre Bürgermeisterin
Wiebke Schwarzweller**
